


## Государственная программа «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

Государственная программа «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 6 июня 2014 года № 267. Государственный заказчик-координатор Программы - Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва.

Общий объем финансирования Программы на 2022 год составляет 1336933,65 тыс. рублей, РБ –1110868,65 тыс. рублей, ФБ –224055,8 тыс. рублей, МБ –2069,2 тыс. рублей, за 2022 год профинансировано –1292087,05 тыс. рублей (91,8%), РБ –1069658,73 тыс. рублей, ФБ –220243,85 тыс. рублей, МБ- 2184,47 тыс. рублей.

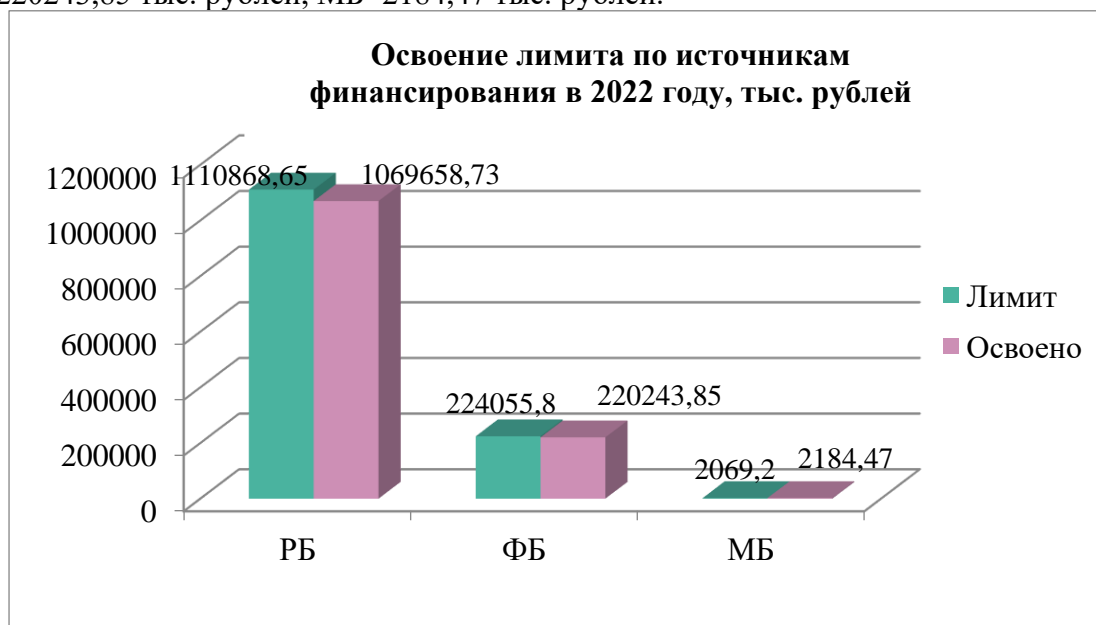

### Результаты реализации программы за 2022 год

По подпрограмме «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2018-2025 годы» в 2022 году объем финансирования на мероприятия подпрограммы составляет 945 678,39 тыс. рублей.

*Очистные сооружения в г. Кызыл с мощностью до 50 тыс. куб. м/сутки Разработка ПСД*

Государственный контракт заключен от 26 ноября 2020 г. № 207-20 на сумму 59 700,0 тыс. рублей с ФГУП «Главное строительное управление Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – ФГУП ГСУ ФСИН России) расторгнут 26 января 2022 г. ФГУП ГСУ ФСИН России включен в Реестр недобросовестных поставщиков 28 февраля 2022 г.

Заключен новый государственный контракт с единственным поставщиком АО Проектное бюро «Луч» от 4 апреля 2022 г. № 69-22 на сумму 52 131 712,40 руб. со сроком выполнения работ до 25.12.2022 г., на основании Постановления Правительства Республики Тыва от 18 марта 2022 г. № 119. Авансирование контрактом предусмотрено в размере 30% от цены контракта.

5 декабря 2022 г. № 17-1-1-3-085087-2022 получено положительное заключение государственной экспертизы.

*Очистные сооружения в г. Шагонар*

Государственный контракт заключен от 7 декабря 2022 г. № 170-22 на сумму 14 196,198 тыс. рублей с ООО «КуйбышевГидроПроект», профинансировано в 2022 году - 8 750,00 тыс. рублей. Проектная документация на стадии разработки. Срок представления май 2023 г

*Очистные сооружения в с. Хову-Аксы*

Государственный контракт заключен от 7 декабря 2020 г. № 210-20 на сумму 7 173,694 тыс. рублей с ООО «Сибпроект», профинансировано в 2022 году – 2 976,243 тыс. рублей. Проектная документация на стадии разработки. Срок представления май 2023 г.

*Техприсоединение к инженерным сетям мкд по ул. Спутник г. Кызыла*

Заключен договор №20.17.00.2162.21 от 10.11.2021 г. на сумму 32 491,6622 тыс. рублей с АО "Тываэнерго". Акты о подключении к инженерным сетям получено. Профинансировано в 2022 году - 3 216,67 тыс. рублей.

*Техприсоединение к инженерным сетям для мкд г. Кызыла по ул. Олега-Сагаан-оола*

Заключен договор на подключение к системе теплоснабжения №НП-055 от 01.06.2020 г. на сумму 6 299,69616 тыс. рублей тыс. рублей. Профинансировано в 2022 г. - 2 204,89 тыс. рублей. Акты о подключении к инженерным сетям получена.

*В рамках программы переселения граждан и детей сирот на благоустройство и наружное освещение прилегающих территорий всего предусмотрено 135 926,796 тыс. рублей, в том числе на 2022 год предусмотрено 51 029,25 тыс. рублей. Всего профинансировано 123 033,663 тыс. рублей, в том числе в 2022 году 38 096,08856 тыс. рублей. Остаток 12 933,16144 тыс. рублей.*

1. Наружное освещение и благоустройство к жилым домам № 1, 2, 3, 4, 5, 6 по ул. Иркутская, г. Кызыл, Республика Тыва: с ООО «Атриум» заключен ГК № 75-20 от 17.06.2020 г. на сумму 30 258,216 тыс. рублей. Профинансировано 27 655,449 тыс. рублей, в том числе в 2022 г. – 1 351,775 тыс. рублей. Остаток 2 602,767 тыс. рублей.

Готовность объекта 90%. Осталось выполнить: посев газона из семян газонных трав, укладка брусчатки. ООО «Атриум» 15.12.2021 г. представлено гарантийное письмо, о том, что работы будут выполнены до 30.05.2022 г. Направлено уведомление о начале работ от 30.03.2022 г., № ЭБ-05-929. ГКУ РТ «Госстройзаказ» 13.09.2022 года № ЭБ-02- 3526 подано исковое заявление в Арбитражный суд Республики Тыва об устранении замечаний по невыполненным работам в рамках исполнения обязательств по объекту в полном объеме, а также взыскать неустойку за просрочку исполнения обязательств. 24 октября 2022 г. прошло первое заседание, второе заседание суда назначено на 16 мая 2023 г.

2. Благоустройство и наружное освещение многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская стр. №17: (ГК № 68-20 от 18.06.2020 г.) на сумму 4096,74599 тыс. рублей, профинансировано 4096,74599 тыс. рублей. Госконтракт исполнен.

3. Благоустройство и наружное освещение многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская (стр. №16): (ГК № 89-20 от 23.06.2020г.) на сумму 5 428,139 тыс. рублей, профинансировано 5 428,139 тыс. рублей. Госконтракт исполнен.

4. Благоустройство и наружные сети по объекту «Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская д. 12, 14»: (ГК № 286-21 от 30.08.2021г.) на сумму 11 659,564 тыс. рублей, профинансировано 11 659,56417 тыс. рублей. Госконтракт исполнен.

5. Благоустройство и наружные сети по объекту «Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская д. 11, 13»: с ООО «Атриум» заключен ГК № 287-21 от 30.08.2021 г. на сумму 11 485,53642 тыс. рублей. Профинансировано 10 401,68340 тыс. рублей, в том числе в 2022 году 1 393,689 тыс. рублей. Остаток 1 083,85302 тыс. рублей. Готовность объекта 78%. Работы по завершению укладки брусчатки выполнено 100%, асфальтирование 100%. Осталось выполнить: монтаж МАФ, озеленение. ГКУ РТ «Госстройзаказ» 13.09.2022 года за № ЭБ-02-3525 подано исковое

заявление в Арбитражный суд Республики Тыва с целью обязать подрядную организацию выполнить работы по благоустройству и наружные сети по объекту в полном объеме, а также взыскать неустойку за просрочку исполнения обязательств. 24 октября 2022 г. прошло первое заседание, второе заседание суда назначено на 16 мая 2023 г.

6. Благоустройство и наружные инженерные сети по объекту «Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская д. № 10/1, № 10/2»: с ООО «Сылдыс» заключен ГК № 288-21 от 30.08.2021 г. на сумму 10 357,923 тыс. рублей, профинансировано 10 357,92326 тыс. рублей. Госконтракт исполнен.

7. Благоустройство и наружные инженерные сети по объекту «Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская д. № 10/3»: с ООО «Капстрой» заключен ГК № 37-22 от 21.02.2022 г. на сумму 3 127,24020 тыс. рублей, профинансировано в 2022 году 3 127,24020 тыс. рублей. Госконтракт исполнен.

8. Благоустройство и наружные инженерные сети по объекту «Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская стр. № 14, 15»: с ООО «Олимпиада» заключен ГК № 91-22 от 16.05.2022г. на сумму 17 622,54 тыс. рублей, допсоглашение на увеличение 3 031,585 тыс. рублей, профинансировано в 2022 году 20 694,125 тыс. рублей. Госконтракт исполнен.

9. Благоустройство и наружные инженерные сети по объекту «Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Каа-Хем, д. 90, а, 90 б, 90 в»: с ООО «Атриум» заключен ГК № 216-21 от 30.08.2021г. на сумму 14 626,486 тыс. рублей, профинансировано 14 626,485 тыс. рублей., в том числе в 2022 году 1366,35366 тыс. рублей. Готовность объекта 90%. Осталось выполнить: посадка деревьев ООО «Атриум» 15.12.2021 г. представлено гарантийное письмо, о том, что работы будут выполнены до 30.05.2022 г.

10. Наружное освещение и благоустройство к строительству 18 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в п. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва, ул. Гагарина 1А: с ООО «Атриум» заключен ГК № 80-20 от 17.06.2020 г. на сумму 4 268,070 тыс. рублей, профинансировано 2 936,607 тыс. рублей, в том числе в 2022 году 1188,940 тыс. рублей. Государственный контракт расторгнут.

11. Наружное освещение и благоустройство к строительству 16 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в п. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва, ул. Мира, д. 14/1 с. Хову-Аксы: с ООО «Атриум» заключен ГК № 79-20 от 17.06.2020 г. на сумму 3 403,160 тыс. рублей, профинансировано 2 102,671 тыс. рублей, в том числе в 2022 году 465,994 тыс. рублей. Остаток 1300,489 тыс. рублей. Государственный контракт расторгнут.

12. Благоустройство 18-ти квартир жилого дома в с.Хову-Аксы по ул. Юбилейная, д. 3 с. Хову-Аксы: с ООО «Атриум» ГК № 133-21 от 08.06.2021 г. на сумму 4 796,8605 тыс. рублей, профинансировано 1 439,05815 тыс. рублей, Остаток 3357,80235. Государственный контракт расторгнут.

13. Благоустройство многоквартирных жилых домов по адресу Юбилейная 9, Юбилейная 13 с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва: с ООО «НИКА» заключен ГК № 89-22 от 13.05.2022 г. на сумму 11 764,730 тыс. рублей, профинансировано в 2022 году 8 507,97170 тыс. рублей. Остаток 3 256, 7583 тыс. рублей. Государственный контракт расторгнут.

*Техприсоединение к Тувинскому институту гуманитарных исследований.*

С АО «Кызылская ТЭЦ» заключен договор от 01.06.2020 г. на сумму 4 756,482 тыс. рублей на технологическое подключение объекта со сроком подключения до 31.12.2020 г. В связи с дефицитом выделенных бюджетных ассигнований профинансировано 3 091,713 тыс. рублей в 2021 году. Оплата кредиторской задолженности в размере 1 664,77 рублей была произведена в 2022 году. После погашения кредиторской задолженности со стороны АО «Кызылская ТЭЦ» была выполнена проверка и опломбировка прибора узла учета.

*Техприсоединение к инженерным сетям детского сада на 280 мест по ул. Дружба г. Кызыл*

Заключен договор № 30-20 от 17.04.2020 г. с ООО "Водоканал-Сервис" 823,11720 тыс. рублей" на водоснабжение детского сада с ООО "Водоканал-Сервис", в связи с представлением акта выполненных работ со стороны ООО "Водоканал-Сервис" профинансировано в 2022 году 123,47 тыс. рублей. Акты техприсоединения к инженерным сетям получено.

*Наружные инженерные сети для 10 домов по программе детей-сирот по ул. Полигонная в мкрн. Спутник*

Наружные инженерные сети для домов по программе детей-сирот по ул. Полигонная в мкрн. Спутник, заключено 3 договора.

1. АО «Тываэнерго» заключен договор от 10.11.2021 г. № 20.1700.2162.2 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям многоквартирных жилых домов на сумму 32 491,662 тыс. рублей, профинансировано 32 491,662 тыс. рублей, оплачено из которых в 2022 году - 12 902,37 тыс. рублей.

2. *Водоканал-Сервис* - заключены 4 договора до 31.12.2022 г.

- от 22.12.2020 г. № 2020/43-К на сумму 29 334,3052 тыс. рублей, профинансировано 29 334,3052 тыс. рублей.

- от 29.06.2021 г. № 2021/13-В на сумму 45 887,969 тыс. рублей, профинансировано 45 887,969 тыс. рублей.

- от 29.06.2021 г. 2021/12-В на сумму 3 378, 600 тыс. рублей, профинансировано 3 378, 600 тыс. рублей.

- от 29.06.2021 г. № 2021/12-К на сумму 1 232,856 тыс. рублей, профинансировано 1 232,856 тыс. рублей.

Работы по водоснабжению, по канализации выполнены в полном объеме.

3. АО «Кызылская ТЭЦ» - заключен договор № КызТЭЦ-21/351 от 19.05.2021 г. на сумму 31 499,323 тыс. рублей, профинансировано – 25 986,942 тыс. рублей.

Оставшаяся доля размера платы договора в размере 5 512,381 тыс. рублей, были перенесены на следующий финансовый год, в связи с неготовностью застройщиком ООО «Энергострой» к подключению к теплоснабжению 5 - ти домов.

- Акт о подключении объекта к системе теплоснабжения от 18.10.2022 г. 5 - ти домов получены.

- Акты о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя от 21.10.2022 г. 5 - ти домов получены.

*По строительству инженерных сетей в мкрн. Монгун, Спутник, западнее ул. Полигонной, д.2, г. Кызыл (ИБК) В Республике Тыва одобрен инфраструктурный бюджетный кредит на проекты комплексной застройки трех микрорайонов "Спутник", 3 и 4 кварталы, "Монгун" и на территории западнее от ул. Полигонная д. 2 города Кызыл Республики Тыва на общую сумму 632 889,00 тыс. рублей, в том числе:*

- комплексная застройка микрорайона "Спутник", 3 и 4 кварталы – 249 888,55 тыс. рублей;

- комплексная застройка микрорайона "Монгун" – 195 000,00 тыс. рублей;

- комплексная застройка микрорайона на территории западнее от ул. Полигонная д. 2 г. Кызыл – 188 000,00 тыс. рублей;

Профинансировано: в 2022 году 632 889,00 тыс. рублей

*Техническое подключение к электрическим сетям водозабора в с. Хову-Аксы. АО "Тываэнерго" заключен договор от 20.04.2022 г. № 20.1700.562.22 об осуществлении технического присоединения к электрическим сетям на сумму 11 397, 47287 тыс. рублей.*

**Профинансировано** в 2022 году - 10 257,725 тыс. рублей, или 90 %.

*По подпрограмме «Чистая вода» в 2022 году предусмотрено 155 009,49 тыс. рублей (ФБ – 155 439,30):*

- 27 628,889 тыс. рублей (ФБ - 27 352,60) по водозабору в с. Хову-Аксы;

- 129 380,60 тыс. рублей (ФБ – 128 086,70) по водозабору в г. Шагонар (95 397,00 по лимиту и 28 877,048 из резервного фонда Правительства РФ, дополнительное соглашение с Минстроем России от 15.12.2022 г. № 069-09-2022-187/6).

Кассовое освоение в 2022 году – 153 158,23 тыс. рублей или 100 % (ФБ – 151 626,648; РБ – 1 531,582).

*По объекту «Реконструкция водозабора и магистрального водовода с. Хову-Аксы»*

Дополнительное соглашение с Минстроем России к Соглашению о переносе срока ввода объекта на 2023 год и о переносе показателей 2022 года на 2023 год заключено от 13 сентября 2022 г. №069-2020-F5001-17/1.3.

28 ноября 2022 г. № 150-22 заключен новый государственный контракт с ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ» от на общую сумму 30 732,099 (ФБ – 27 352,60, РБ – 3 379,49) тыс. рублей, со сроком ввода объекта в эксплуатацию до 1 ноября 2023 г. Авансирование 90 % - 27 658 889,00 рублей оплачен.

Ввод объекта по соглашению с Минстроем – декабря 2023 г.

*По объекту «Реконструкция водозабора, г. Шагонар»* объем финансирования составляет 230 288,38 тыс. рублей (ФБ – 227 985,5, РБ – 2 302,89), в том числе:

- в 2021 году – 104 759,04 тыс. рублей (ФБ – 103 711,45, РБ - 1 047,60);

- в 2022 году – 129 380,683 тыс. рублей (ФБ – 128 086,88, РБ – 1 293,81), из них из резервного фонда Правительства РФ 33 019,98 тыс. рублей (ФБ - 32 689,78, РБ – 330,20).

15 декабря 2022 г. № 069-092022-187/6 заключено дополнительное соглашение с Минстроем России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта об уменьшении лимита 2022 года на сумму 125 529,34 (ФБ-124 274,05, РБ-1255,29) тыс. рублей.

Всего заключено 2 госконтракта на общую сумму 230 288,38 тыс. рублей:

- 223 431,98 тыс. рублей на ООО «Строй Экспресс»;

- 6 856,40 тыс. рублей на ФБУ «РосСтройКонтроль».

Кассовое освоение: всего профинансировано – 230 288,38 тыс. рублей (ФБ – 227 985,50; РБ – 2 302,88) - (223 431,98 тыс. рублей - ООО «Строй-Экспресс»; 6 856,40 тыс. рублей – РосСтройКонтроль), из них:

в 2021 году – 104 759,04 тыс. рублей (ФБ – 103 711,45; РБ – 1 047,6);

в 2022 году – 125 529,342 тыс. рублей (ФБ – 124 274,0486; РБ – 1 255,2934).

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано от 28 декабря 2022 г.

Из 11 целевых показателей: достигнут - 8, частично достигнуты - 1, не достигнуты – 2.

№ п/п	Целевые индикаторы	Единица измерения	2022 год		Примечание
			План	Факт	
1	Обновление технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства специализированной техникой	единиц	6	6	Достигнут
2	Снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 2025 года на 29 процентов	единиц	3,625	инф не представлена	инф не представлена
3	Сохранение рабочих мест в действующих малых котельных и водоснабжающих организациях	процентов	604	604	Достигнут
4	Создание рабочих мест	единиц	214	156	Частично достигнут
5	по водоотведению на 2017 год составляет 57,1	процентов	6,3	инф не представлена	Не достигнут

6	Повышение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в 2024 году до показателя 47,6 процента (базовое значение 24,5 процента)	процентов	38,1	38,1	Достигнут
77	Суммарный прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию (базовое значение 75 575 чел.)	человек	3779	3779	Достигнут
8	Повышение качества питьевой воды для населения республики посредством реконструкции систем водоснабжения посредством строительства и реконструкции систем водоснабжения	штук	1	1	Достигнут
9	Строительство и обустройство угольных складов	единиц	8	8	Достигнут
10	Ликвидация стихийных свалок	единиц	5	15	Достигнут
11	Приобретение оборудования по сбору ТКО	штук	150	221	Достигнут

В результате оценки эффективности государственная программа «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025» признана низкоэффективной.
